План-график выполнения работ
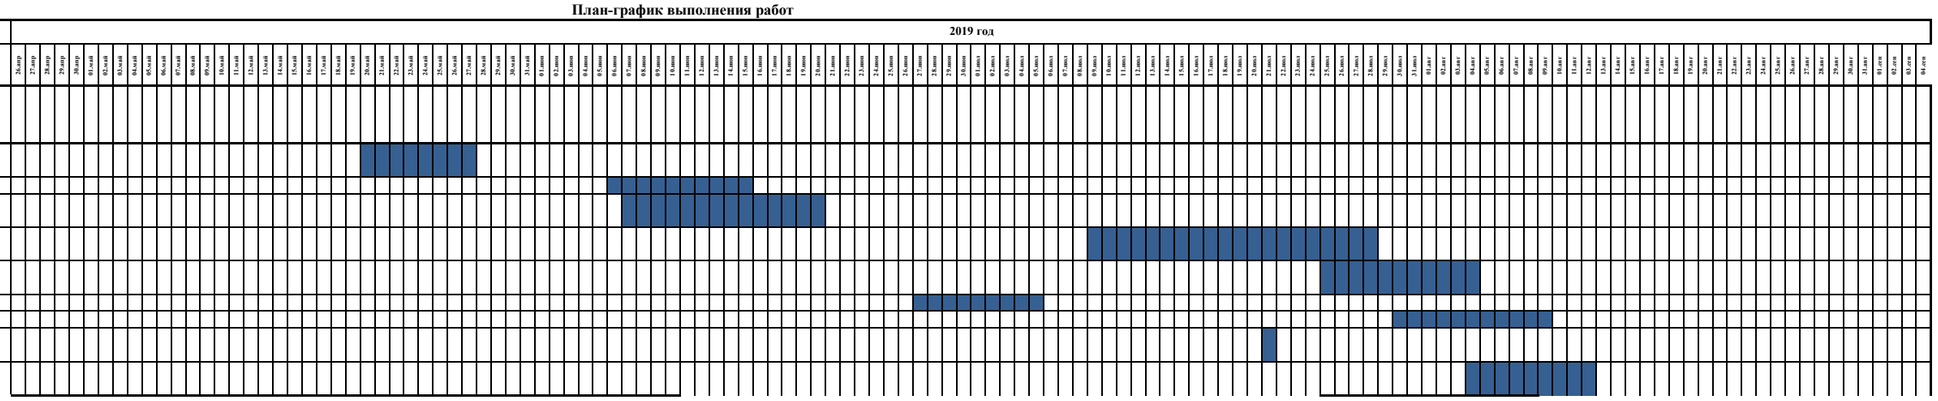
№	Наименование объекта	Стои-мость, т.р.	Протя-жён-ность, м	Площадь, м2	Асфальт, т	
					н. слой	в. слой
VI	**Шоссе Восточное на участке от улицы Цементная до шоссе Северное**	**30 688,962**	**1224**	**20365**	**2857.51**	**2460.1**
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий фрезой					
2	Демонтаж бортовых камней					
3	Установка гранитных бортовых камней ГП-1			2447 м.		
4	Устройство выравнивающего слоя из пористого асфальтобетона					
5	Устройство покрытия из плотного асфальтобетона					
6	Восстановление тротуаров			153		
7	Устройство газонов			3650		
8	Замена люков и кирпичных горловин колодцев			1 шт		
9	Брагоустройство придорожных территорий
